

Dagboek AARTSHERTOGENLAAN 413, Ondergrondse containers

AARTSHERTOGENLAAN 413

Bandenlijn verzakt


AARTSHERTOGENLAAN 413

Shertogenbosch (NL)

Nummer: Ondergrondse containers -1

Datum: 19 juni 2024 10:59

Status werf

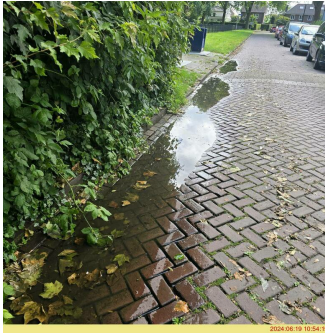

In de bijlage het dagboek van het werk

Opmerkingen

Opmerking	Omschrijving
Dagboek	

19 juni 2024

Rijbaanherstel aan de Aartshertoglaan nabij Pieterbreugelaan

Situatieschets

Aan de Aartshertoglaan, tegenover de Pieterbreugelaan, bevinden zich twee ondergrondse afvalcontainers. De banden rondom deze containers zijn over een lengte van 23 meter verschoven of wegereden. Dit heeft ertoe geleid dat de omliggende tegels klem zijn komen te zitten en uiteindelijk zijn gebroken. Daarnaast is de rijweg verzakt, waardoor deze over de volledige breedte opnieuw bestraat moet worden. De aanwezige verkeersdrempel is eveneens ernstig verzakt.

Advies globaal uit te voeren Werkzaamheden

1. Rijbaan

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de rijbaan:

Oppervlakte: 23 meter x 4,6 meter = **106 m²**

2. Banden 218/20/25

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van banden met stalen ijzers aan de zijkant:

Lengte: **24 meter**.

3. Drempel

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de verkeersdrempel:

Afmeting: 5 meter x 2,3 meter = **11,5 m²**

4. Tegels rond de containers

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van tegels rond de ondergrondse containers:

Oppervlakte: **9 m²**

5. Inritblokjes

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van inritblokjes:

Afmetingen: 60x30 cm, **4 stuks**

6. Gootlaag

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de gootlaag (2 streklagen):

Lengte: **46 meter**

Extra Materialen

Aanleveren van banden: **6 stuks**

Aanleveren van tegels (30x30x4,5 cm): **5 m²**

Aanleveren van gebakken BKK-materiaal: **6 m²**

Aanleveren en profileren van zand: **5 m³**


Aanbeveling:

Het is van essentieel belang dat de genoemde herstelwerkzaamheden in een keer worden uitgevoerd dit de omliggende infrastructuur en de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

Wij adviseren om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk in te plannen en rekening te houden met mogelijke verkeershinder gedurende de uitvoering.

Indien verdere details of een specifieke planning vereist zijn, kan dit document worden uitgebreid.

Omgevingstekening ter goedkeuring aanbieden aan de afd. verkeer.

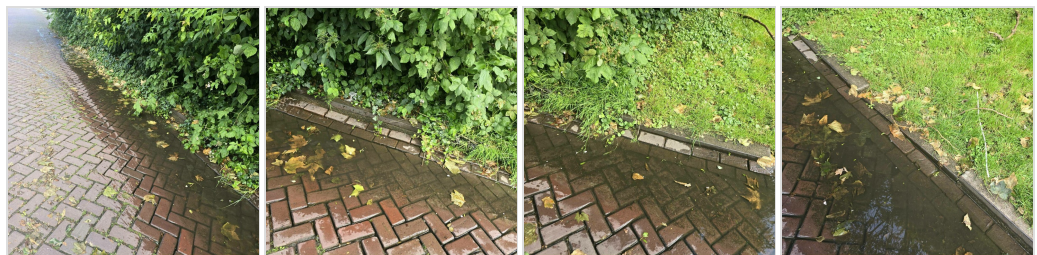



's-Hertogenbosch
